

石油钻采设备及配件加工项目竣工 环境保护验收监测报告

中环验收 2018021 号

建设单位：大庆亿源石油科技发展有限公司

编制单位：大庆中环评价检测有限公司

2019 年 4 月

建设单位法人代表： (签字)

编制单位法人代表： 

项 目 负 责 人：

填 表 人：

建设单位：大庆亿源石油科技开发有限
公司

编制单位：大庆中环评价检测有限公司有限
公司

电话:15045909648

电话:0459-6778866

传真:

传真:0459-6778866

邮编:

邮编:163311

地址:大庆市红岗区解放一街南侧

地址:黑龙江省大庆高新区创业新街 25 号南附六
楼主五楼左半部



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91230607057448623P

名称 大庆中环评价检测有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
住所 黑龙江省大庆高新区创业新街25号南附六楼主五楼左半部
法定代表人 安玉多
注册资本 壹仟壹佰万圆整
成立日期 2013年01月05日
营业期限 长期
经营范围 水和废水检测, 废气和环境空气检测, 土壤、污泥和固体废物检测, 生活饮用水检测, 油气回收装置检测, 消毒产品检测, 辐射检测, 公共场所检测, 一次性使用卫生用品检测, 一次性使用医疗用品检测, 安全评价服务, 环境评估服务, 防雷装置检测, 室内环境检测, 水利资源开发利用咨询服务, 水环境保护咨询服务, 水土保持技术咨询服务, 生态监测。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关



请于每年1月1日至6月30日登陆全国企业信用信息公示系统(黑龙江) gsxt.hljaic.gov.cn报送年度报告, 逾期不报将列入经营异常名录。

2017 年 11 月 27 日



检验检测机构 资质认定证书

证书编号：160812050934

名称：大庆中环评价检测有限公司

地址：黑龙江省大庆高新区创业新街25号南附六楼主五楼左半部（163316）

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任由大庆中环评价检测有限公司承担。

许可使用标志



发证日期：2018年03月15日

有效期至：2022年10月16日

发证机关：黑龙江省质量技术监督局

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

表一 建设项目工程概况

建设项目名称	石油钻采设备及配件加工项目				
建设单位名称	大庆亿源石油科技开发有限公司				
建设项目性质	新建				
建设地点	大庆市萨尔图区中兴南街 14 号				
主要产品名称	取套压器、油压座、水井取样器				
设计生产能力	取套压器 500 套/a、油压座 2000 套/a、取样器 800 套/a				
实际生产能力	取套压器 500 套/a、油压座 2000 套/a、取样器 800 套/a				
建设项目环评时间	2017 年 5 月	开工建设时间	2017 年 9 月		
调试时间	2017 年 11 月	验收现场监测时间	2019 年 3 月 27--28 日		
环评报告表 审批部门	大庆市萨尔图区环境保护 局萨环审发【1017】9 号	环评报告表 编制单位	国环宏博（北京）节能环保科技有 限责任公司（国环评证乙字第 1061 号）		
环保设施设计单位	国环宏博（北京）节能环保 科技有限责任公司	环保设施施工单位			
投资总概算（万元）	650	环保投资总概算	7.6	比例	1.2%
实际总概算	650	环保投资	11	比例	1.7%
验收监测依据	<p>一、建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度：</p> <p>1、《中华人民共和国环境保护法》（2014 年 4 月 24 日修订，2015 年 1 月 1 日起实施）；</p> <p>2、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016 年 7 月 2 日修订，2016 年 9 月 1 日起实施）；</p> <p>3、《中华人民共和国水污染防治法》（2017 年 6 月 27 日修订，2018 年 1 月 1 日起实施）；</p> <p>4、《中华人民共和国大气污染防治法》（2015 年 8 月 29 日修订，2016 年 1 月 1 日起实施）；</p> <p>5、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996 年 10 月）；</p> <p>6、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2005 年 4 月 1 日）；</p> <p>7、《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012 年 7 月 1 日实施）；</p> <p>8、中华人民共和国国务院令第 682 号文《建设项目环境保护管理条例》（2017 年 10 月 1 日起实施）；</p> <p>二、建设项目竣工环境保护验收技术规范：</p> <p>1、国环规环评〔2017〕4 号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》；</p> <p>2、生态环境部 2018 年第 9 号公告《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》；</p> <p>3、排污单位自行监测技术指南 总则（HJ 819-2017）。</p> <p>三、建设项目环境影响报告及其审批部门审批决定：</p> <p>1、国环宏博（北京）节能环保科技有限责任公司负责编写《石油钻采设备及配件加工项目环境影响报告表》；（国环评证乙字第 1061 号）2017.5</p> <p>2、大庆市萨尔图区环境保护局《关于石油钻采设备及配件加工项目环境影响报告表的批复》（萨环审发【2017】10 号）2017.6.14</p>				

续表一

验收监测评价标准、标号、级别、限值

1、：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值

32、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2 类标准。

表 1-1			颗粒物无组织排放监测点及浓度限值	单位：mg/m³
作业场所	污染物项目	颗粒物无组织排放监控位置		浓度限值
技嘉车间	颗粒物（TSP）	厂界外 20m 处上风向设参照点，下风向设 3 个监测点		1.0

表 1-3		工业企业厂界环境噪声排放标准	单位：dB（A）
类别	昼间	夜间	
2 类	60	50	

表二项目内容、生产工艺流程及原辅材料消耗

工程建设内容：

项目位于大庆市萨尔图区中兴南街 14 号，东经 125° 04′ 11.6′ ′，北纬 46° 34′ 06.7′ ′。项目北侧 70m 为采油二厂第一作业区采油 47 队，西侧亿源石油科技有限公司，南侧为闲置厂房，距商服 35m, 东侧 7m 为涂料厂。东北侧 640m 大庆体校。建设性质为新建，占地面积 2200m²，总建筑面积 1068 m²。项目租用大庆国有资产处置有限公司闲置厂房及办公室，建设油田钻采配件生产线，安装车床等设备 20 台套，年产取套压器 500 套、油压座 2000 套、取样器 800 套。企业定员 42 人，其中管理人员 5 人。每天生产 8 小时，全年共生产 251 天。项目地理位置图、平面设计图，见图 2-1、2-2

工程建设内容一览表

项目名称		建设内容
主体工程	生产车间	租用闲置车间，建筑面积 778m2，砖混结构。安装车床、钻床等设备 20 台套。
辅助工程	质检室	租用闲置建筑，建筑面积 120m ² ，砖混结构，用于产品检验。
储运工程	库房	租用闲置建筑，建筑面积 370m ² ，砖混结构，用于储存钢材等原料。
	刀具室	租用闲置建筑，建筑面积 120m ² ，砖混结构，用于存储车床刀具。
公用工程	共排水工程	项目生产和生活用水来自自来水管网，少量生活污水和试压水排水排入自建防渗水池，定期拉运至乘风庄污水处理厂（即大庆油田萨南实业公司污水处理厂）
	供暖工程	本项目租用现有厂房和办公室，冬季偶有生产，使用电暖器取暖
	供电工程	本项目生产、生活用电由市政电网供给
环保工程	噪声治理	各台车床安装减振垫
	固废治理	建设危险废物暂存间，废切削液和废机油使用暂存桶盛装
	污水治理	少量生活污水和试压水排水排入自建防渗水池。定期拉运至乘风庄污水处理厂（即大庆油田萨南实业公司污水处理厂）
办公及生活设施	办公室	租用现有砖混结构办公室 2 间，建筑面积 200m ² 为管理人员办公场所
	宿舍	租用现有休息室 1 间，工作人员中午临时休息（夜间无人居住）建筑面积 430m ² 。
	卫生间	建筑面积 90m ² 。

续表二

变更情况：

项目验收期间经现场核实，项目建设内容、整体规模、环保设施等均无变更。

原辅材料消耗及水平衡：

原辅材料消耗表

序号	原材料名称	规格	用量	产地
1	无缝钢管	Φ 76*10	10t/a	鞍钢、太原钢铁厂
2	无缝钢管	Φ 76*6	6t/a	鞍钢、太原钢铁厂
3	无缝钢管	Φ 73*6	5t/a	鞍钢、太原钢铁厂
4	无缝钢管	Φ 60*5	3.5t/a	鞍钢、太原钢铁厂
5	无缝钢管	Φ 32*3.5	2t/a	鞍钢、太原钢铁厂
6	圆钢	Φ 90	2t/a	鞍钢、太原钢铁厂
7	圆钢	Φ 80	2t/a	鞍钢、太原钢铁厂
8	圆钢	Φ 60	1.5t/a	鞍钢、太原钢铁厂
9	圆钢	Φ 50	1t/a	鞍钢、太原钢铁厂
10	焊条		0.2t/a	天津
11	润滑油		0.8t/a	大庆
12	切削液		1.5t/a	大庆


续表二

主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点）

生产工艺流程

1、产品生产工艺流程

本项目不包含喷漆工序和机件打磨工序，生产工艺及产污节点见下图：

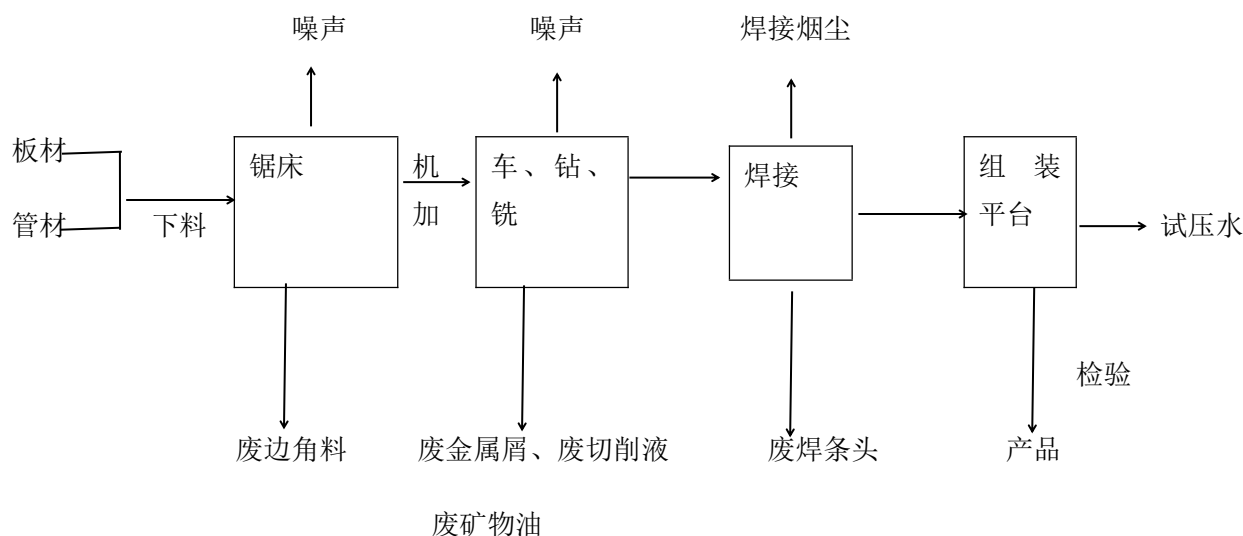

图：生产工艺流程及产污节点

2、生产工艺简述

本项目油压座、取样器等产品的加工主要是车、钻、铣等机械加工，利用各种车、钻、铣等加工工艺对金属材料进行冷加工，使之获得符合一定几何形状、尺寸精度和表面质量技术要求的产品构件，主要生产工艺说明如下：

-----下料：该工序按产品尺寸的需要利用锯床对钢材原材料进行切割下料；

-----机加成型：对切割好的材料进行车、钻、铣等机械加工成型；

----- 焊接装配：对部分加工好的部件进行焊接组合进行装配成为成品。

-----零部件配装：对加工好的部件进行组合、装配为成品；

-----检验入库：对零部件检查各项技术指标是否符合要求，并进行水压试验，检验合格后包装入库、待销。对不合格产品，采用车、钻、铣等机械设备二次加工，以符合所要求。

表三主要污染源及污染物

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位）

1、废水

本项目生产试压水新鲜用水量 10t/a，循环使用定期补加，最终排放量为 2t/a。厂区不包含食堂，员工日常生活用水主要是清洗水和卫生设施用水，员工生活用水量按每人 50kg/d 计算，用水量为 527t/a，污水排放量 422t/a，污水排入自建污水防渗储池，定期外雇污水罐拉运至乘风庄污水处理厂（即大庆油田萨南实业公司污水处理厂）处理。

2、废气

本项目废气主要为焊接过程中产生焊烟尘（颗粒物）本项目焊接量较少，焊条年用量为 0.2t，每天排放的焊接烟尘量为 2.2kg/a，排放量较小，焊接工序在车间内进行，厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB-16297-1996）限制要求。

3、噪声

项目生产车间车床等设备产生噪声，通过对噪声源设备采取基座安装减振垫、厂房隔声等措施。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类功能区噪声排放限值要求。

4、固体废物

1)边角废料、金属切削屑和废焊条头

生产过程中金属刚从下料工艺将产生金属材料废边角料及车、钻等机加工序将产生废金属切削屑，焊接工序产生少量废焊条头，金属材料废边角料、废金属切削屑及废焊条头，可再生利用，均出售给废回收站。

2)生活垃圾及含油抹布


生活垃圾及含油抹布，委托环卫部门清运至生活垃圾填埋场，进行卫生填埋处理。

3)废切削液、废机油、含油抹布

车间车床、钻床等设备产生废切削液、废机油，属于危险废物，根据《国家危险废物名录》（部令第 39 号）（2016 版）危险废物代码分别为：HW09-900-006-09、HW08-900-249-08。产生量分别为：1.5t/a、0.8t/a。项目建设面积为 5m²的危险废物暂存间，并使用包装桶暂存后，并委托有危险废物处理资质的单位处置。项目运营期产生的固体废物满足“资源化、无害化、减量化”处理处置原则。

续表三

监测点位示意图

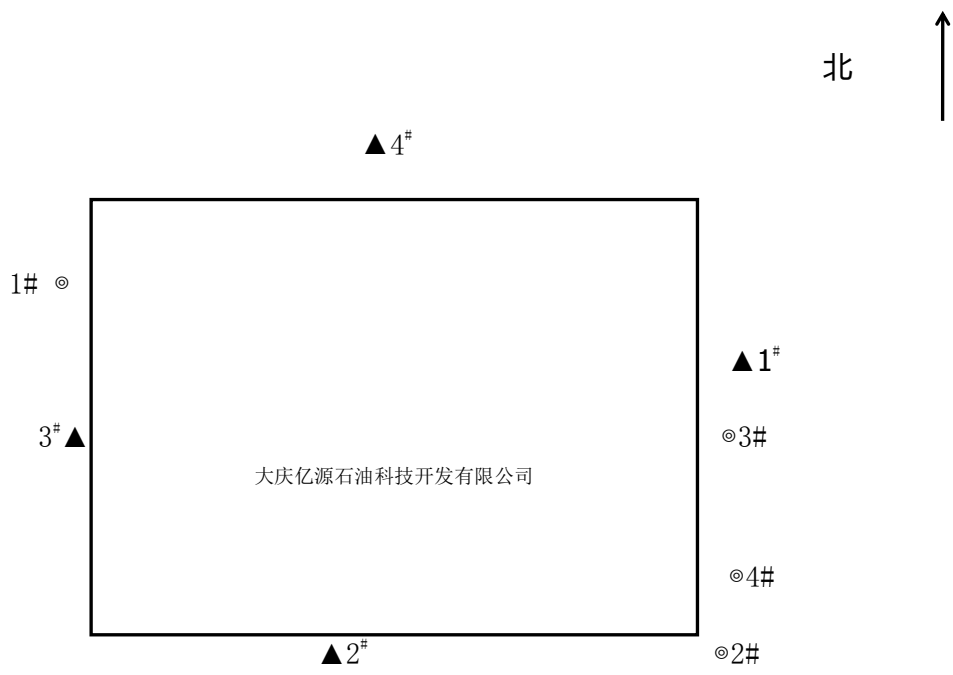

注： ▲厂界环境噪声监测点位 ⊙废气监测点位

续表三

三、环保投资估算

该项目环评设计总投资 650 万元，环保投资 7.6 万元，占项目总投资的 1.2%。实际该项目环保投资 11 万元，占项目总投资的 1.6%。环保投资估算见表 3-1。

表 3-1 本项目实际环保投资明细表

类别	环保措施及设施名称	投资概算 (万元)	实际建设	实际金额 (万元)
噪声	设备安装减震垫等	0.1	设备安装减震垫等	1.0
废水	建设 30m³ 防渗污水储池	6.0	建设 30m³ 防渗污水储池	7.0
固体废物	建设 1 座危废暂存间、暂存设施	1.5	建设 1 座危废暂存间.	2.5
其他				0.5
		7.6	/	11
项目总投资		650		
环保投资占项目投资比例		1.2%	/	1.6%

表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定：

环境影响报告表主要结论

一、环境质量现状评价结论

项目所在区域大气环境质量现状满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类区标准要求；地表水环境质量现状满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求，环境质量现状良好。

二、环境影响评价结论

1、地表水环境影响评价结论

本项目运营期生活污水和少量试压排水排入亿源公司防渗污水储池内，定期拉运至乘风庄污水处理厂处理，对环境影响可以接受。

2、声环境影响评价结论

本项目建成运营后，噪声源主要来自生产车间。在采取噪声源设备合理布局及机座减振降噪措施后，可有效减小噪声源对环境的影响，项目运营期生产设备噪声对厂界环境的影响可以被接受。

3、大气环境影响评价结论

本项目运营期外排大气污染物为无组织排放的焊接烟尘，在采取报告表中要求的相应措施后可以达标排放，对大气环境影响可以被接受。

4、固体废物环境影响评价结论

本项目运营期产生的固体废物在采取本报告表所述处理处置措施后，固体废物得到妥善处置与处理，有利用价值的废物得到再利用，固体废物处理处置满足“资源化、减量化、无害化”原则，项目运营所产生的固体废物对环境不会构成显著性不良影响。

三、综合评价结论

本项目建设符合国家企业政策，选址合理可行，项目建设在认真落实本报告提出的各项污染防治措施后，可满足污染物达标排放，不会对评价区域环境构成显著性不良影响，从环境保护的角度分析，本项目建设是可行的。

续表四

审批部门审批决定

大庆百世圣科石油机械制造有限公司：

你单位上报的《石油钻采设备及配件项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经技术审查、局审批领导小组研究后，批复如下：

一、该项目建设地点位于大庆市萨尔图区中心南路 14 号，建设性质属新建，占地面积 3100m²。总投资 650 万元。同意你单位按照《报告表》所列建设项目的地点、性质、规模、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行建设。

二、项目运营期应注意做好以下工作

1、要严格按照《报告表》提出的污染防治措施和环境管理要求进行生产管理。

2、本项目运营产生的废水主要是员工生活污水和少量试压排水，产生的污水排入自建防渗污水储池内，定期拉运至乘风庄污水处理厂处理。

3、本项目在运营过程中产生的固体废物主要是生产边角废料、金属屑、废焊条头、废切削液、废机油及员工的生活垃圾。边角废料、金属屑、废焊条头、废切削液、废机油等生产垃圾。边角废料、金属屑、废焊条头等生产垃圾定点收集后外售处理；废切削液和废机油等属危险废物，委托有资质单位处理。生活垃圾进行无害化处理。

4、本项目在生产过程中，产生的噪声源主要是机械设备，源强通过基础减振、厂房隔声等措施，是噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2 类标准要求。

三、各项环保措施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，建设单位向萨尔图区环保局提出申请环境竣工验收，经验收合格后方可正式投产运行。

四、本批复只对报告表中的内容有效，如果建设内容、地点、规模等发生改变，项目环境影响评价文件必须重新报批。

五、萨尔图区环境保护局负责该项目的日常环境监督管理工作。

萨尔图区环境保护局

2017 年 6 月 14 日

表五 验收监测质量保证及质量控制

验收监测质量保证及质量控制：

根据建设项目验收和环境管理的有关要求，开展项目竣工环境保护验收监测首先应编制监测方案，并经报批，方可实施。项目竣工验收监测工作量大、任务重，要保证监测工作的质量并有序开展，必须在监测方案中详细说明有关的质量保证措施，并在实际工作中监督落实。监测方案要在现场勘察的基础上，结合《建设项目环境影响评价报告表》中的有关标准、技术文件、监测规范的要求而编制。

1、采样现场的质量保证

工况控制是保证验收监测取得真实可靠监测结果的前提。采取必要的核查手段对监测期间的产品生产规模、设备运转出力情况进行严格的控制，保证验收监测必须达到的生产负荷。可通过核定原料投入量、产品产量、能源（水、电、汽、煤、油等）消耗量、“三废”排放量、观察生产设施中的仪表（如压力表、温度计、流量计等）和检查操作台帐记录、了解职工当班人数等方法考察监测期间的工况。生产负荷达不到验收监测条件应即刻停止现场采样和测试。

2、监测分析方法及分析仪器信息

序号	监测项目	分析方法名称	方法标准号	分析仪器及型号
01	厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准	GB 12348-2008	积分式声级计 （噪声仪）
02	颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法	GB/T 15432-1995	精密电子天平 FA2004

续表五

人员能力

工作人员通过培训、考核、实际操作等持证上岗。定期各个部门组织人员培训、学习相关标准。

噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

测量日期	校准声级dB (A)			备注
	测量前	测量后	差值	
2019. 3. 27	93. 7	93. 9	0. 2	测量前、后校准声级差值小于0. 5dB (A) 测量数据有效。
2019. 3. 28	93. 6	93. 9	0. 3	

表六

验收监测内容：

根据国务院令第 682 号《建设项目环境保护管理条例》、环保总局令第 13 号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》和国家环境保护总局环发[2003]38 号文《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》的规定及《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》确定监测内容。

验收监测内容：

监测类别	监测位置	监测项目	监测点数	监测频次
废气	厂界周边	颗粒物	4	3 次/天，2 天
噪声	厂界周边	噪声	4	昼、夜各 1 次， 连续 2 天

表七 验收监测生产工况及验收监测结果

验收监测期间生产工况记录：

本项目验收监测期间，主体工程工况稳定、环境保护设施运行正常，符合验收监测条件。

验收监测结果：

1、废水

本项目生产试压水循环使用定期补加，厂内不包含食堂，项目产生的污水排入自建污水防渗储池，定期外雇污水罐拉运至乘风庄污水处理厂（即大庆油田萨南实业公司污水处理厂）处理。不外排

2、废气

颗粒物监测结果：在 0.055~0.072mg/m³ 之间，监测结果均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值。

单位：mg/m³

监测点位	监测频次	2019.03.27	2019.03.28
		颗粒物	颗粒物
厂界上风向 1#	1	0.060	0.055
	2	0.063	0.061
	3	0.058	0.053
厂界下风向 2#	1	0.063	0.057
	2	0.066	0.065
	3	0.061	0.055
厂界下风向 3#	1	0.068	0.061
	2	0.070	0.069
	3	0.065	0.060
厂界下风向 4#	1	0.065	0.064
	2	0.072	0.067
	3	0.066	0.064
浓度限值		1.0	1.0

浓度限值依据：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值

续表七

3、噪声

项目验收期间，厂界噪声昼间监测数据范围在 54.1~56.0dB（A）之间，夜间监测数据范围在 44.1~45.9dB（A）之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2 类区标准限值要求。

厂界噪声监测结果

单位：dB（A）

监测地点	监测时间	监测点位	昼间	夜间
厂界	2019.03.27	1 [#] （厂界东）	55.3	45.8
		2 [#] （厂界南）	54.9	45.5
		3 [#] （厂界西）	53.5	44.4
		4 [#] （厂界北）	53.7	44.1
	2019.03.28	1 [#] （厂界东）	56.0	45.9
		2 [#] （厂界南）	55.3	45.6
		3 [#] （厂界西）	54.5	44.3
		4 [#] （厂界北）	54.8	44.8
标准限值			60	50

标准限值依据：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2 类功能区标准限值。

表八验收监测结论

验收监测结论:

该项目环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产运行的“三同时”的环保政策，并有健全的环保制度。项目投产试运行后，及时申请竣工环保验收监测。监测期间，相应的环保设施运行正常，监测结果表明，外排污染物浓度达到相应排放标准和环评批复的要求。经现场核查，生产能力达到设计能力的 75%以上，各项环保治理设施正常运行，符合验收监测要求。

1、废水

项目验收期间，厂区不包含食堂，生产试压水循环使用定期补加，最终与生活污水一同排入自建污水防渗储池，定期外雇污水罐拉运至乘风庄污水处理厂（即大庆油田萨南实业公司污水处理厂）处理。

2、废气

项目验收期间，厂界无组织废气颗粒物排放浓度在 $0.055\sim0.072\text{mg}/\text{m}^3$ 之间满足《大气污染物综合排放标准》（GB-16297-1996）限制要求

3、噪声

项目验收期间，厂界噪声昼间监测数据范围在 $53.5\sim56.0\text{dB}(\text{A})$ 之间，夜间监测数据范围在 $44.1\sim45.9\text{dB}(\text{A})$ 之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类功能区噪声排放限值要求。对厂界及周围声环境影响较小。

4、固体废物

生产过程中金属钢材下料工艺产生金属材料废边角料、车、钻等机加工序将产生废金属切削屑及焊接工序产生少量废焊条等可再生利用，均出售给废旧金属收购部门进行回收再利用。生活垃圾，委托环卫部门清运至生活垃圾填埋场，进行卫生填埋处理。

车间车床、钻床等设备产生废切削液、废机油，属于危险废物，项目建设危险废物暂存间 1 座，危险废物暂存间完全按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）相关要求建设，并委托有危险废物处理资质的单位处置。项目运营期产生的固体废物满足“资源化、无害化、减量化”处理处置原则。。

综上所述，根据现场调查及监测结果，大庆百世圣科石油科技有限公司石油钻采设备及配件加工项目，落实了环评报告表及环评批复所提出的各项污染防治措施，废水、废气、噪声达标排放，固体废物去向明确。

表九 验收监测结论

综合结论：

从本次的验收监测结果看：该项目验收监测期间工况运行良好；环保制度健全，机制运行良好。废气监测值、噪声监测值可满足相关标准要求，固体废物得到了妥善处置。由此可知，在该项目管理规范、处理设施稳定运行的情况下，各项指标均可以达标排放。各项环保措施满足国环宏博（北京）节能环保科技有限责任公司负责编写《石油钻采配件加工项目环境影响报告表》；（国环评证乙字第 1061 号）和大庆市红岗区环境保护局《关于石油钻采配件加工项目环境影响报告表的批复》（岗环审【2017】02 号 2017.5.22）的相关要求，因此，就本次验收监测情况看，建议大庆亿源石油科技发展有限公司石油钻采设备及配件加工项目通过项目竣工环境保护验收。

建议：

- 1、加强环保设施的日常维护和运行管理，确保环保设施正常运行。
- 2、建设单位对照验收监测报告表，梳理项目存在的环保问题。
- 3、危险废物暂存间严格按照相关规定管理，做好出入库登记。
- 4、做好企业环境信息公开工作，定期公布企业环境信息。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表人（签字）： 王晓红

项目经办人（签字）：王丽娟

填表单位（盖章）：

建设项目	项 目 名 称	大庆亿源石油科技开发有限公司石油钻采设备及配件加工项目					建 设 地 点		大庆市萨尔图区中兴南街 14 号						
	行 业 类 别	C-3311 金属结构制造					建 设 性 质		新建						
	设计生产能力	-		建设项目开工日期		2017 年 9 月		实 际 生 产 能 力		-		投入试运行日期		2017 年-	
	投资总概算（万元）	650					环 保 投 资 总 概 算（万元）		7.6		所占比例（%）		1.2%		
	环 评 审 批 部 门	大庆市萨尔图区环境保护局					批 准 文 号		萨环审发【2017】9 号		批 准 时 间		2017 年 6 月 14 日		
	初 步 设 计 审 批 部 门						批 准 文 号				批 准 时 间				
	环 保 验 收 审 批 部 门	大庆市萨尔图区环境保护局					批 准 文 号				批 准 时 间				
	环保设施设计单位			环保设施施工单位					环评单位		国环宏博（北京）节能环保科技有限责任公司				
	实际总投资（万元）	650					实际环保投资（万元）		11		所占比例（%）		1.6%		
	废水治理（万元）	7.0	废气治理（万元）		0	噪声治理（万元）	1	固废治理（万元）		2.5	绿化及生态（万元）				其它（万元）
建设单位	单 位 名 称	法人代表		邮 政 编 码	联系电话	验收监测单位	单位名称		证书编号	法人	联系电话	通讯地址		邮政编码	
	大庆亿源石油科技开发有限公司	穆洪义		1 6 3 3 1 1	15045909648		大庆中环评价检测有限公司		160812050934	安玉多	13945612444				
污 染 物 排 放 达 标 与 总 量 控 制（工业建设项目详填）	污 染 物	原有排放量(1)	本期工程实际排放浓度(2)	本期工程允许排放浓度(3)	本期工程产生量(4)	本期工程自身削减量(5)		本期工程实际排放量(6)	本期工程核定排放总量(7)	本期工程“以新带老”削减量(8)	全厂实际排放总量(9)	全厂核定排放总量(10)	区域平衡替代削减量(11)	排放增减量(12)	
	废水														
	COD														
	氨氮														
	废气														
	颗粒物														
	SO ₂														
	NO _x														
	固体废物														

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少 2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)-(11) +（1） 3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年；

附件：环境保护局批复文件

大庆市萨尔图区环境保护局文件

萨环审发〔2017〕9号

石油钻采设备及配件 加工项目环境影响报告表的批复

大庆亿源石油科技发展有限公司：

你单位报送的《石油钻采设备及配件加工项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经技术审查、局审批领导小组研究后，批复如下：

一、该项目建设地点位于大庆市萨尔图区中兴南街14号，建设性质属新建，占地面积3100m²，总投资650万元。同意你单位按照《报告表》所列建设项目的地点、性质、规模、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行建设。

二、项目在运营期应注意做好以下工作

1、要严格按照《报告表》提出的污染防治措施和环境管理要求进行生产管理。

2、本项目运营产生的废水主要是员工生活污水和少量试压排水，产生的污水排入自建防渗污水储池内，定期拉运至乘风庄污水处理厂处理。

3、本项目在运营过程中产生的固体废物主要是生产边角废料、金属屑、废焊条头、废切削液、废机油及员工的生活垃圾。边角废料、金属屑、废焊条头等生产垃圾定点收集后外售处理；废切削液和废机油属于危险废物，委托有资质单位处理。生活垃圾要进行无害化处理。

4、本项目在生产过程中，产生的噪声源主要是机械设备，源强通过基础减震、厂房隔声等措施，使噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

三、各项环保措施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，建设单位应向萨尔图区环保局提出申请环保竣工验收，经验收合格后方可正式投产运行。

四、本批复只对报告表中的内容有效，如果建设内容、地点、规模等发生改变，项目环境影响评价文件必须重新报批。

五、萨尔图区环保局负责该项目的日常环境监督管理工作。

萨尔图区环境保护局

2017年6月14日

附件：营业执照

	
<h1>营 业 执 照</h1>	
<p>(副 本)</p>	
<p>统一社会信用代码 91230607795034254K</p>	
名 称	大庆亿源石油科技开发有限公司
类 型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住 所	黑龙江省大庆市高新区新风路8号服务外包产业园D-1座711室
法定代表人	穆洪义
注 册 资 本	柒仟零壹拾万圆整
成 立 日 期	2007年01月16日
营 业 期 限	长期
经 营 范 围	压力管道制造;石油钻采设备及配件、井下工具及配件的生产、销售;计算机软、硬件开发及销售;石油钻采设备维修;除尘设备及配件、滤布、自动化控制设备及零配件的研发、生产、销售及技术服务;油田技术服务;五金产品、电料、电线电缆、水处理设备、消防设备、食品、化工产品(不含危险化学品)、仪器仪表、建筑材料、钢材、防腐保温材料、电器设备、照明器材、水暖配件、办公用品、电子产品、日用杂品、服装、鞋帽、针纺织品、文具用品的销售;工程机械设备及配件、泵、阀门、小型机具的制造及销售;电缆桥架、电力金具、线路金具、封闭母线、玻璃钢制品、玻璃纤维的制造及销售;进出口业务(需审批除外);变压器、电动机的销售及维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
	登 记 机 关
<p>请于每年1月1日至6月30日登陆国家企业信用信息公示系统(黑龙江) gsxt.hljaic.gov.cn报送年度报告,逾期不报将列入经营异常名录。</p>	
<p>2019 年 01 月 28 日</p>	
<p>企业信用信息公示系统网址: gsxt.hljaic.gov.cn</p>	
<p>中华人民共和国国家工商行政管理总局监制</p>	

附件：房屋租赁合同

国资房租合字：2016 年第 10 号

房屋租赁合同

甲方(出租人)：大庆市国有资产处置有限公司

乙方(承租人)：大庆亿源石油科技开发有限公司

根据庆办发[2005]40 号文件精神，甲方代表产权所有人大庆市国有资产经营有限公司，将招租房屋租与乙方签订本合同，乙方已对承租的房屋现状做了充分的了解，愿意承租该房屋。甲乙双方经充分协商，就下列房屋租赁事项订立本合同，共同遵守。

第一条 租赁房屋坐落 萨区中兴南街 14 号

房产面积：2068 平方米。

第二条 租赁期限自 2016 年 4 月 20 日至 2024 年 4 月 19 日。

第三条 年租金(大写)：壹拾贰万伍仟元整。¥：125000 元。

第四条 租金的支付期限及方式：

1、租金采用分期按年支付的方式。签订本合同时一次性交齐第一年的租金并同时交纳年租金百分之十的抵押金。

2、以租期起始时间为计算期，每整年到期日提前一个月交纳下一年的租金。

第五条 乙方负责支付房屋的水费、电费、卫生费、租赁证费等及经营过程中的相关税费。

第六条 租赁房屋的用途：乙方保证承租该房屋仅作商服用房使用，如改变用途，须经甲方同意。

第七条 租赁房屋的维修：租赁期间乙方承担维修义务，所需经费均由乙方承担。由于水、电、暖等方面原因造成财产损失，乙方自行承担。

其余租金退还乙方，甲方则不承担违约责任，也不负责赔偿乙方任何经济损失。

第十六条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成时，向甲方所在地人民法院起诉。

第十七条 本合同未尽事项，甲乙双方可另行议定，其补充条款或补充协议经双方签章后与本合同具有同等效力。

第十八条 本合同一式三份，甲方两份，乙方一份。

第十九条 其他约定事项：

- 1、乙方要保证安全用电，安全防火，配备必要的消防器材。
- 2、乙方在承租房屋内严禁存放易燃易爆物品。
- 3、乙方在承租房屋到期前一个月内向产权交易中心报名申请继续租赁，如不按期报名后果自负。
- 4、乙方在承租房屋到期前六十日内以书面形式向甲方确认是否续租，如有意续租应按规定程序参与竞租。

甲方：(盖章)

法定代表人：

联系电话：

签订地点：大庆市国有资产处置有限公司

签订时间：2016年6月24日

乙方：(盖章)

法定代表人：

联系电话：

附件：危废转运协议

危险废物转移处置协议

根据《固体废物污染防治法》的有关规定，大庆亿源石油科技有限公司（以下简称甲方）产生废机油，预计 0.1 吨，大庆圣德雷特化工有限公司（以下简称乙方）具有黑龙江省环保厅核发的危险废物经营许可证，编号（2306061504），现甲方委托乙方对上述废矿物油进行处置，具体事项如下：

- 1、甲方负责上报本单位废物转移审批相关手续到所在地环境保护行政主管部门。
- 2、甲方负责对需转移的废物未出厂管理。
- 3、乙方应具有危险废物处置的能力，负责办理接受地环境保护行政主管部门的相关手续。
- 4、乙方在转移废物时应遵守甲方安全环保方面的有关规定，并在甲方的监督管理下进行作业。
- 5、乙方遵守国家法律规定使用符合标准的运送工具运送废物，满足运输标准要求。
- 6、乙方负责按转移联单的指定地点及规定时间对废物进行运送，并按国家规定进行安全利用、处置，不得转移给第三方，自废物装车出厂完成，乙方对运输过程中交通安全、环境污染防治等工作事项负全部责任。
- 7、废物出厂前的安全环保责任由甲方承担；自废物转移出厂开始，所有安全环保责任由乙方承担。
- 8、本协议一式六份，双方各三份。

甲方：大庆亿源石油科技有限公司（盖章）

甲方法人（委托代理人）：徐占有

甲方联系人：徐占有 联系电话：15045909648

乙方：大庆圣德雷特化工有限公司（盖章）

乙方法人（委托代理人）：曾凡华

乙方联系人：曾凡华 联系电话：15246001666

签订日期：2017 年 5 月 25 日

附件：污水处置协议

生活污水委托处理协议

甲方：大庆油田萨南实业污水处理分公司

乙方：大庆亿源石油科技开发有限公司

1 总则

1.1 根据《中华人民共和国合同法》等法律法规，甲乙双方在公平、自愿和诚实信任的基础上，本着互惠互利的原则，就乙方公司的生活污水处理事宜达成本协议。

1.2 甲方同意接纳乙方生活污水并进行处理，乙方通过车辆运输将生活污水排放到甲方指定的地点，甲方按工艺要求将生活污水进行处理后并达到油田回注水标准，用于油田回注。

1.3 甲方工作人员负责填写乙方的生活污水排放记录，乙方现场工作人员负责签字确认。生活污水排放记录作为甲乙双方的结算依据。

2、费用及支付方式

2.1 费用及支付方式分为两部分。

一是生活污水接纳协议文本费用 10000 元。包括签字费、文本费、化验费、资料费。

二是生活污水实际接纳处理费，单价 5.00 元/立方米，结算以生活污水排放记录为依据，每月 5 日前乙方向甲方结清上个月的污水处理费。

3 协议期限

附件：环保应急预案

环保应急预案

编制人：徐占有

审核人：刁琢

批准人：穆洪义

大庆亿源石油科技发展有限公司

2019 年 4 月 9 日

附件：企业规章制度

企业规章制度

编制人：徐占有

审核人：刁琢

批准人：穆洪义

大庆亿源石油科技开发有限公司

2019 年 4 月 9 日

附件：验收监测报告

ZHJC



监测报告副本

报告编号：中检(环)字 2019 第 0112 号

委托单位：大庆亿源石油科技开发有限公司

监测类别：验收监测

样品类别：噪声、废气

大庆中环评价检测有限公司

2019 年 03 月 30 日



大庆亿源石油科技开发有限公司监测报告

报告编号: 中检(环)字 2019



说 明

- 1、本报告未加盖本公司检验检测专用章、及骑缝章无效。
- 2、本检测报告仅对本次样品报告结果的符合性负责。
- 3、未经本公司批准不得擅自复印报告中的部分内容。
- 4、如对本报告提出异议,请于收到报告之日起 15 日内向本公司提出。

单位名称: 大庆中环评价检测有限公司

地址: 黑龙江省大庆高新区创业新街 25 号南附六楼主五楼左半部

邮政编码: 163316

电话: 0459-6778866、6715678

传真: 0459-6778866





基本情况

受大庆亿源石油科技发展有限公司委托，我公司于 2019 年 03 月 27 日~28 日对大庆亿源石油科技发展有限公司噪声、废气进行了监测。根据委托方的要求及相关规定，确定本次监测的监测项目、点位和频次等。

二、监测内容

1、噪声

监测项目：厂界噪声

监测点位：4 个，厂界四周东、南、西、北各设 1 个监测点；

监测频次：昼夜各监测 1 次/天，连续监测 2 天。

2、废气

监测项目：颗粒物；

监测点位：4 个，厂界上风向 1 个、下风向 3 个；

监测频次：3 次/天，连续监测 2 天。

三、质量保证

全部监测过程按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）等标准和规范中的要求进行质量控制；样品分析中采用平行双样和密码空白进行自控。

监测中所使用的各类仪器，经黑龙江省计量检定测试院、大庆市质量技术监督检验检疫中心、大庆油田计量检定测试所等检定机构检定或校准，且检定合格。

四、监测项目、分析方法及监测仪器

监测项目、分析方法及分析仪器详见表 1。



大庆亿源石油科技开发有限公司监测报告

报告编号: 中检(环)字 2019



表 1

监测项目、分析方法及分析仪器信息

序号	监测项目	分析方法名称	方法标准号	分析仪器及型号
01	厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准	GB 12348-2008	积分式声级计 (噪声仪)
02	颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法	GB/T 15432-1995	精密电子天平 FA2004

五、监测结果

厂界噪声监测结果详见表 2;

厂界废气监测结果详见表 3。

表 2

厂界噪声监测结果

单位: dB (A)

监测地点	监测时间	监测点位	昼间	夜间
厂界	2019.03.27	1 [#] （厂界东）	55.3	45.8
		2 [#] （厂界南）	54.9	45.5
		3 [#] （厂界西）	53.5	44.4
		4 [#] （厂界北）	53.7	44.1
	2019.03.28	1 [#] （厂界东）	56.0	45.9
		2 [#] （厂界南）	55.3	45.6
		3 [#] （厂界西）	54.5	44.3
		4 [#] （厂界北）	54.8	44.8
标准限值			60	50
标准限值依据：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类功能区标准限值。				



大庆亿源石油科技开发有限公司监测报告

报告编号：中检（环）字 2019 第 15 号



表 2


厂界废气监测结果

单位：mg/m³

监测点位	监测频次	2019. 03. 27	2019. 03. 28
		颗粒物	颗粒物
厂界上风向 1#	1	0.060	0.055
	2	0.063	0.061
	3	0.058	0.053
厂界下风向 2#	1	0.063	0.057
	2	0.066	0.065
	3	0.061	0.055
厂界下风向 3#	1	0.068	0.061
	2	0.070	0.069
	3	0.065	0.060
厂界下风向 4#	1	0.065	0.064
	2	0.072	0.067
	3	0.066	0.064
浓度限值		1.0	1.0

浓度限值依据：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值

监测点位分布图如下：

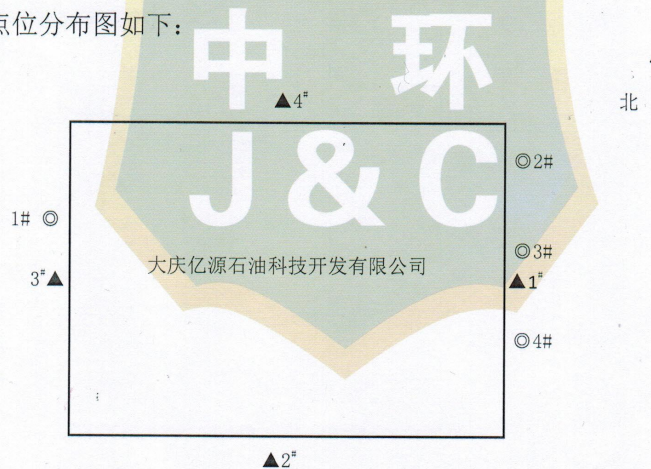

注： ▲厂界噪声监测点位 ◎废气监测点位



六、监测结论

- 1、从表 2 可知,大庆亿源石油科技开发有限公司厂界噪声监测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)2 类功能区标准限值要求。
- 2、从表 3 可知,大庆亿源石油科技开发有限公司厂界废气颗粒物浓度监测值符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 无组织排放监控浓度限值要求。



编制人: 张彩红

审核人: 王明月

签发人: 王明月



附图：固废暂存间



附图：现场图片



声 明

- 1、我对大庆亿源石油科技发展有限公司石油钻采配件加工项目进行的验收监测工作已经完成，现将监测报告交付给你们，如贵单位对报告内容有异议，请在接到报告十五日内与我公司联系。
- 2、本报告只对本次监测负责。
- 3、本报告无检验检测专用章无效。
- 4、本报告涂改无效。
- 5、本报告部分复印无效。
